

Übersicht Bauteilgruppe

04.09.2024

Gruppennummer: **KLY-GR09**

Bauteilgruppe:	Stahlkassetten Fassadenkonstruktion
eBKP-H:	C02.01 Aussenwandkonstruktion
Abmessungen*:	Stahlkassetten Fassadenkonstruktion, 187 m ² à ca. 50 x 8 cm
Menge*:	ca. 187 m ²
Verortung im Quellobjekt:	Waschanlage - Aussenwand
Detailbeschreibung*:	Montawall MK80/500 Kassetten mit eingelegter Wärmedämmung 80mm. Im Ecotool hinterlegt als Bauteil KLY-GR09. Masse und Spezifikationen gemäss Produktangaben, nach Rückbau zu prüfen. Plangrundlage Bestand siehe Minenbeschreibung.
Stückliste*:	KLY017 / Stahlkassetten Fassadenkonstruktion: ca. 50 x 8 cm, 187 m ²
Emissionen für ein identisches, neues Bauteil in kg CO₂-eq:	24 kg pro m ²
Emissionen durch die Wiederverwendung des Bauteils in kg CO₂-eq:	1,5 kg pro m ²



*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.

Gruppennummer: **KLY-GR09**

04.09.2024

Anhang:



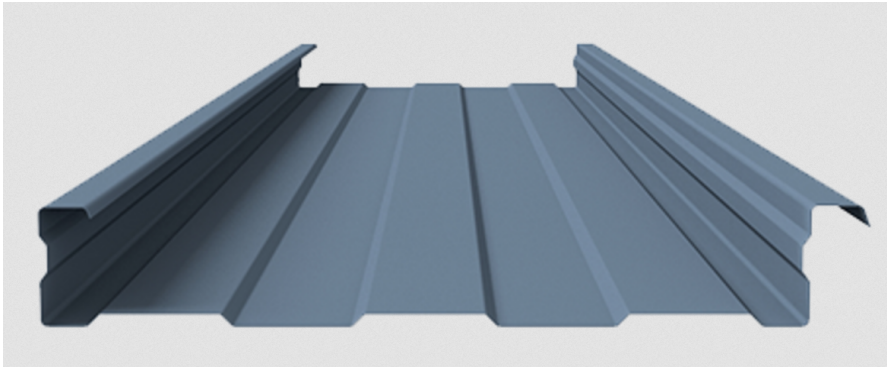

KLY017
187 m2

Datenqualität

- ☐ Schätzung
- ☒ ungefähre Masse
- ☐ genaue Masse

- ☐ händische Massaufnahme durch see/haw
- ☐ LIDAR
- ☒ Bestandespläne

■ verschweisste Elemente, Angaben ungefähr

KLY-GR09

187 m2 **Stahlkassetten Fassadenkonstruktion**

Bussystem Provisorium - Areal Klybeck, Basel

Massstab 1:50

Plangrösse A4

Gezeichnet haw

Datum 07.08.2024

Bauteilpass

04.09.2024

Bauteilnummer:**KLY017**

(gehört zu Bauteilgruppe KLY-GR09)

Bauteil:	Stahlkassetten Fassadenkonstruktion
eBKP-H:	C02.01 Aussenwandkonstruktion
Menge*:	187 m2
Abmessungen*:	ca. 50 x 8 cm
Verortung im Quellobjekt:	Waschanlage - Aussenwand
Zustand:	Abnutzungen ersichtllich
Detailbeschreibung*:	Montawall MK80/500 Kassetten mit eingelegter Wärmedämmung 80mm.
Herstellerin / Baujahr:	Montana Bausysteme AG / ca. 2020

*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt.
Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.
